Stand Up

11/38
issue completate
github.com/stand-up-arcade-milan/Standup-platform ↗

4 dic
SAL 2

17 dic
presentazione finale

FASE 0 AVVIO 4/4

#4	Kickoff, consegna dati e intervista requisiti	Comune
#5	Ruoli, repository Git unico e convenzioni	Comune
#6	Esplorazione dati 2024 e 2025 e catalogo anomalie	BID
#7	Definizione KPI, approvati dal cliente	BAD

FASE 1 ANALISI E PROGETTAZIONE 5/7

#1	Requisiti e perimetro MVP	Comune
#8	Analisi processo commerciale	BAD
#9	Schema dati condiviso su PostgreSQL	BID
#10	Contratto API, specifica OpenAPI	BID
#11	Privacy by design e modello di sicurezza	Comune
#12	Mockup back office, cruscotto e portale	Comune
#13	Preparazione presentazione SAL 1	Comune

FASE 2 FONDAMENTA 0/8


#15	Creazione database e caricamento 2024	BID
#17	API base: espositori, spazi, contratti	BID
#18	Back office Power Apps: listino e planimetria	BAD
#19	Flusso commerciale: pratica, offerta, contratto, acconto	BAD
#16	Caricamento edizione 2025 e anomalie	BID
#20	Dati commerciali nel modello condiviso	Comune
#22	Prima versione report Power BI sui KPI	BAD
#23	Prova integrata della demo SAL 2	Comune

FASE 3 MODULI IN AUTONOMIA E INTEGRAZIONI 0/9

#25	Tornelli e scanner in tempo reale	BID
#30	RLS e tutela dati dei minori	Comune
#28	Stima presenze dal peso, dati simulati	BID
#26	App di scansione allo stand	BAD
#27	Cruscotto staff: affluenza e picco	BID
#29	Report direzione: edizioni, ricavo per m², costo per contatto	BAD
#32	Portale espositori e riepilogo post-fiera	BID
#33	Rinnovo espositori dal contratto precedente	BAD
#34	Riconciliazione dei numeri tra le viste	Comune

FASE 4 CHIUSURA E CONSEGNA 0/3

#36	Test end-to-end delle tre fasi	Comune
#37	README, specifica API e pulizia repository	Comune
#38	Slide e prove della demo dal vivo	Comune

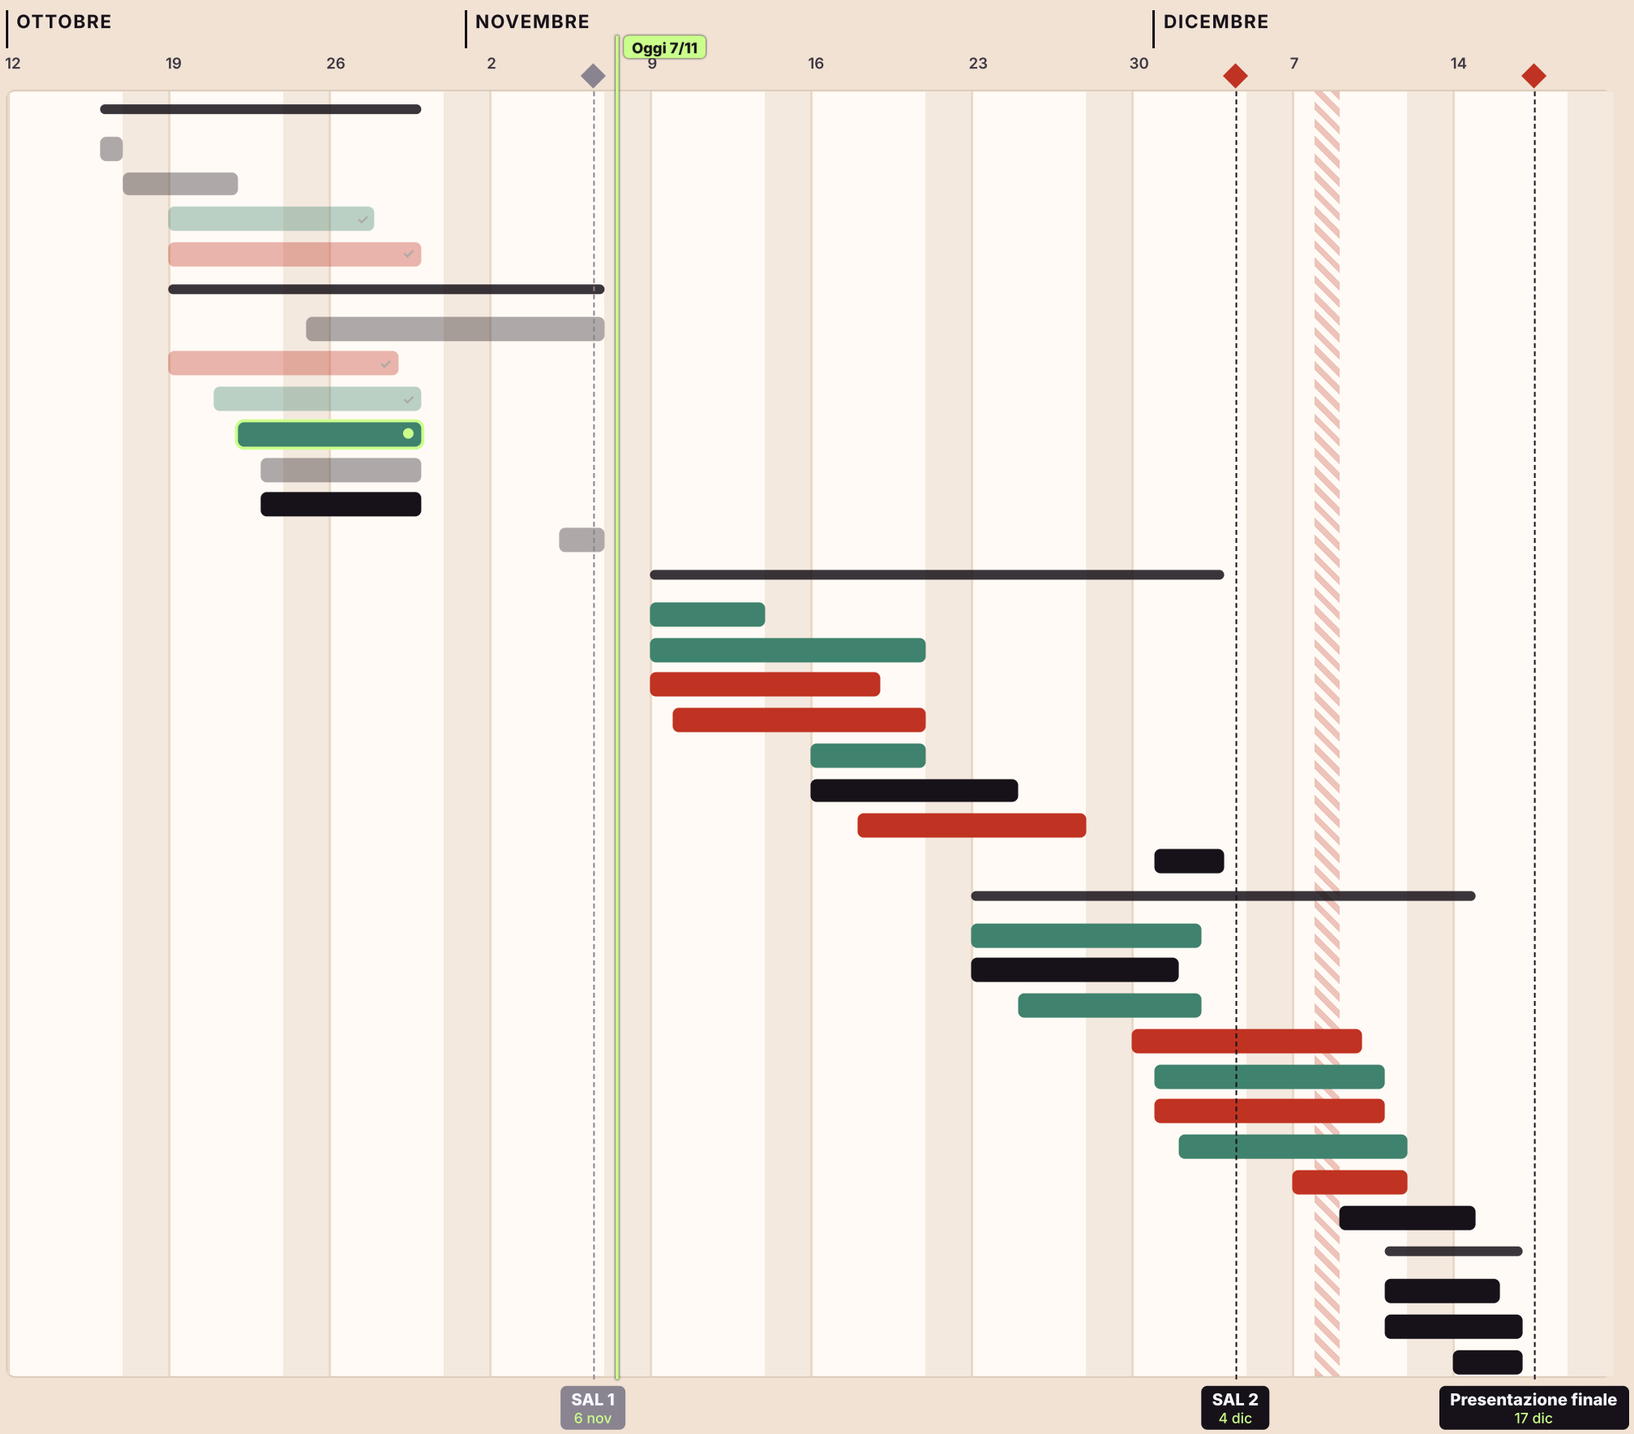

BID · Dati e codice · BAD · Power Platform · Comune e gestione · ✓ Completata · In corso · SAL e consegna · 8 dicembre, festivo

Stato al cliente: 20/11 · 27/11 · 11/12
